

(الف)

موافقتنامه

موضوع پیمان: عملیات اجرای احداث و ترمیم جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان دزفول

کد طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱

کد پروژه: ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱

نام پیمانکار: شرکت آوند آب جنوب

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:



موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ / / بین آقای احمد زارعی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول به کد اقتصادی ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و آقای حمید خرمیان نماینده شرکت آوند آب جنوب به کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۶۷۳۳۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۶۷۰ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از:

عملیات اجرای احداث و ترمیم جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان دزفول شامل :

بوته کنی، شخم زدن، بستر کوبی و خاکریزی و شن ریزی رویه جهت احداث و ترمیم جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان دزفول طبق نقشه و مشخصات و دستورکار دستگاه نظارت براساس فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱ به طول ۸۰۰ متر.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) فهرست بها و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستور العملها و استانداردها و استانداردهای فنی

ز) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چار چوب اسناد، مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتجلسه باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اوایت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اوایت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.



ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف): یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و دو ریال.

و (به عدد) ۱.۴۷۵.۸۱۵.۳۶۲ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند. ضریب پیمان، برابر با ۱.۴۰۵۵ است.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

(الف) این پیمان، از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

(ب) مدت پیمان ۱ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

(ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۳ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان فوق اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده مهندسین مشاور آب خاک انرژی جنوب که در این پیمان دستگاه نظارت یا مهندس مشاور نامیده می‌شود به نشانی: خوزستان، اهواز، کمپلو، خیابان امیرکبیر شمالی، پلاک ۱۱، تلفن ۰۶۱-۳۳۷۷۷۷۵۱ واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.

ماده ۷. حل اختلاف:

با توجه به اختیار حاصله از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان: در صورت هر گونه اختلاف در تعبیر، تفسیر و اجرای این تفاهم نامه داور مرضی الطرفین یا هیات داورى به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین گردیده و طرفین نسبت به اعتراض به نظر و رای داور یا هیات داورى مذکور اسقاط حق نمودند رای مذکور قاطع دعوا خواهد بود.

ماده ۸. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول

نشانی پیمانکار: دزفول، خیابان سعدی، بین هجرت و حضرت رسول، پلاک ۱۷، تلفن: ۰۹۱۶۳۴۶۳۵۱۶

نماینده پیمانکار

حمید خرمیان

امضا



نماینده کارفرما

احمد زارعی

امضا

Handwritten signature of Ahmad Zarei.

(ب)

شرایط عمومی

شرایط عمومی پیمان مطابق بخشنامه ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۳ منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور به طور کامل ضمیمه این قرارداد بوده و لازم الاجرا می باشد.



(ج)
شرایط خصوصی



این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوطه به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بوجه به همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بوجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ - الف) پیمانکار متعهد است که برای اجزای موضوع پیمان تعداد ----- نفر / ماه کارشناسی خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

در پیمان فوق به کارشناس خارجی نیازی نیست. /

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۳ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن ، بشرح زیر است :

تهیه برنامه زمانبندی به روش CPM به همراه منابع مورد نیاز اعم از نیروی انسانی و ماشین آلات (جدول پیوست)

مدت قرارداد : ۳۱ روز

ردیف	شرح	مدت (روز)
۱	تحويل نقشه ها و قطعات	۳
۲	تجهیز کارگاه	۳
۳	عملیات اجرایی	۱۹
۴	کنترل و رگلاژ	۳
۵	تحويل قطعات تسطیح شده	۳
۶	جمع	۳۱

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد .

گزارش پیشرفت کار به صورت ماهانه از وضعیت عملیات اجرایی، وضعیت هوا، آمار پرسنل و ماشین آلات، مسایل و مشکلات اجرایی و نمایش روند کار به همراه عکس و فیلم باشد. /

ماده ۱۹ - الف) و ماده ۱۹ - ب) کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری.

پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلاف یا مغایرتی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مشاور و کارفرما برساند.



ماده ۲۰ - الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

کارفرما هیچ تعهدی در این زمینه نداشته و پیمانکار بایستی امکانات مورد نیاز را تهیه نماید. /

ماده ۲۰ - ب و ۲۰ - ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.

کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد. /

ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.

پیمانکار موظف است کلیه ماشین آلات سالم و آماده به کار مورد نیاز برای انجام عملیات موضوع پیمان را چه از نظر نوع و چه تعداد با توجه به ماهیت پروژه و به تناسب پیشرفت کار تدارک ببیند. ضمناً در صورت ایجاد نقص فنی در هنگام کار، پیمانکار موظف است ظرف مدت ۳ روز نسبت به تعمیر و راه اندازی اقدام نماید، در غیر این صورت دستگاه جدید و سالم جایگزین نماید. حداقل ماشین آلات سالم و آماده به کار مورد نیاز جهت اجرای موضوع پیمان شامل :

۲ دستگاه کمپرسی ، ۱ دستگاه غلتک، ۱ دستگاه آبیاش، ۱ دستگاه گریدر و در صورت نیاز یک دستگاه بولدوزر می باشد. /

ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:

۱- تامین و تجهیز یک باب واحد مسکونی در سطح منطقه برای اسکان عوامل مشاور و کارفرما با کلیه امکانات به صورت اجاره.

۲- تامین و تجهیز یک باب واحد اداری جهت دفاتر کارگاه مشاور با کلیه امکانات شامل میز، کامپیوتر، پرینتر و سایر لوازم اداری و وسایل سرمایشی و گرمایشی. (ساختمان به صورت اجاره و لوازم جهت زمان اجرای پروژه)

۳- تامین روزانه چهار پرس غذا با کیفیت مطلوب جهت کارکنان مشاور و کارفرما.

* توضیح: لوازم اداری قید شده در بند ۲ پس از پایان پروژه متعلق به پیمانکار می باشد.

ماده ۲۱ - الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ، نگه داری و حراست از ماشین آلات و ابزاری می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد.

ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

طبق شرایط عمومی پیمان. /

ماده ۲۱ - و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است:

احداث و نگهداری راههای انحرافی تماماً برعهده پیمانکار است و هزینه ای از این بابت پرداخت نمی گردد. /

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار



یک نسخه از آلبوم نقشه های تسطیح و قطعه بندی اراضی با پلان نهر و زهکش های درون مزرعه
دراختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. /

ماده ۲۲ - ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستور العملی راه آندازی، تممیر، نگهداری و راهبری و
نقشه های چون ساخت که پیمان کار تهیه می کند، به شرح زیر است:
پس از پایان عملیات اجرایی دو نسخه نقشه "چون ساخت" مطابق با عملیات انجام شده توسط
پیمانکار تهیه شده و تحویل کارفرما و مشاور خواهد شد. /

ماده ۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند
مشخصات پیمانکار جزء از نظر سوابق و تجهیزات به کارفرما معرفی و در صورت تایید کارفرما
اقدام بلامانع می باشد. /

ماده ۲۵) اجرای کار در شب

کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد. /

ماده ۲۸ - الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند.

تامین زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه برعهده پیمانکار می باشد. /

ماده ۲۹ - ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

به این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد. /

ماده ۳۲ - الف) عملیات اجرایی پیمانکار همیشه زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام می شود:

نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید به هیچ وجه از میزان
مسئولیت پیمانکار نمی کاهد.

ماده ۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، پس از تأیید کار توسط کارفرما طی دوره

تضمین می باشد و طبق مصوبه شماره..... مورخ..... هیات وزیران است.

۵۰٪ سپرده حسن انجام کار پس از تحویل موقت و باقیمانده آن پس از تحویل قطعی آزاد
می گردد.

ماده ۳۶) میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳
مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیات وزیران است.

پرداخت براساس صورت وضعیت ارائه شده جهت هر قسمت از کار تمام شده پس از طی مراحل قانونی
خواهد بود. میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳
مورخ ۸۳/۸/۱۱ و اصلاحیه آن بشماره ۲۰۰۷۱/ت/۳۰۹۸۰ مورخ ۸۳/۴/۲۱ هیات وزیران
و دستورالعمل استفاده از تضمین نوع (ه) به شماره ۱۰۰/۹۱۶۲۰ مورخه ۸۷/۱۰/۱ است. پرداخت به صورت
اسناد خزانه اسلامی می باشد.

ماده ۳۷ - پرداخت ها: تمام پرداختها از محل اوراق خزانه اسلامی "اخزا ۰۰۱" با سررسید
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ می باشد. /

ماده ۳۸ - الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:
پرداخت ارزی ندارد. /

ماده ۳۸ - ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تامین می کند.

کارفرما تعهد ارزی ندارد. /



کارفرما تعهد ارزی ندارد. /

ماده ۳۸ - هـ) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تامین می کند.

پیمان فوق خرید ماشین آلات و ابزار خاص ندارد.

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهای که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

پیمانکار موظف است قطعات یا قسمت هایی از کار که عملیات اجرایی آنها تکمیل گردیده با هماهنگی با مشاور و کارفرما تحویل نماید. /

ماده ۴۷ - د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است.

ماده ۴۹ - ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب زیر، پرداخت می شود.

پرداخت طبق شرایط عمومی پیمان صورت می پذیرد.

ماده ۵۰ - الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

کارفرما هیچگونه تعهدی درمورد پرداخت هزینه تسریع کار ندارد. /

ماده ۵۰ - ب - ۶) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

مطابق شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد. /

نماینده کارفرما

احمد زارعی

امضا

نماینده پیمانکار

حمید خرمیان

امضا



(د)

فهرست بها ومقادير



نام پروژه یا موضوع کار:	عملیات اجرای احداث جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان دزفول	
نام دستگاه اجرایی:	سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول	
نام مهندسین مشاور:	مهندسین مشاور آب خاک انرژی جنوب	
نام دستگاه نظارت:	مهندسین مشاور آب خاک انرژی جنوب	
کد و عنوان طرح:	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱	
کد و عنوان پروژه:	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱	
نوع اعتبار:	عمرانی	
مدت پروژه:	۱ ماه	خورشیدی
مبلغ برآورد:	۱۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
مبلغ پیمان:	۱.۴۷۵.۸۱۵.۳۶۲ ریال	ضریب پیمان: ۱.۴۰۵۵



« خلاصه ارقام و فواصل سستیهای »


نام پروژه: **جاده های دسترسی مزارع شهرستان درزنگول**
 نام دستگاه اجرائی: **سازمان جهاد کشاورزی خوزستان**
 نام مجتهدین مشاور: **مهندسین مشاور آب خاک انورزی جنوب**
 نام مجتهدین مشاور پیشتنم: **سازمان جهاد کشاورزی خوزستان**
 نام و شماره طرح: **مستندات اجرائی اعداد و برنده جاده های دسترسی مزارع حوزه شهرستان درزنگول**
 تاریخ: **۱۴۰۱**

نام دفترچه فهرست بها: **فهرست بها سال ۱۳۹۸** و **فهرست بها سال ۱۳۹۹**
 شماره قرارداد: **۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵**

نام سستیها	مقدار	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد
سستیهای	۷۵۴۰۰۰۰۰۰	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵	۷۷۶۶۲۷۲۶۶۵۵
سختی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
سختی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
سختی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
سختی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
سختی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
سختی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
سختی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جمع کل با احتساب ضرایب: ۱۰۰	جمع کل با احتساب ضرایب: ۱۰۰
جمع کل با احتساب ضرایب: ۱۰۰	جمع کل با احتساب ضرایب: ۱۰۰
جمع کل با احتساب ضرایب: ۱۰۰	جمع کل با احتساب ضرایب: ۱۰۰

۴۰,۲۸۴,۵۶۳



«خلاصه مالی دفترچه ها»

شماره بستان:

نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

کد مدرک: ۱۴۰۱۱ / ۱

نام مهندس مشاور: مهندس مشاور آب خاک انرژی جنوب

برورد: جاده های دسترسی مزارع شهرستان دزفول

نوع ضرب: باضراب

بجهیز به روس: درصدی از مبلغ باضراب

وضعیت: مبلغ دفترچه ها

انگله	جمع برآوردی کل	مبلغ بجهیز	درصدی	جمع برآوردی	سپارد دار	فهرست بها	عنوان دفترچه	ردیف
فاکتوری	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۳۸۴.۵۵۳	۴٪	۱.۰۰۹.۶۱۵.۴۴۷	۰	۱.۰۰۹.۶۱۵.۴۴۷	بازراب آبی و بند نیروگاه	۱



«سیمایغ قفمول»

كد پرورد:

نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

وضعیت: سیمایغ قفمول

نام عهدتس سمناور: عهدتس سمناور آب خاكي انرزی جنوب


تاریخ: ۱۴۰۱ / ۱

كد مدرک:

پرورد: جهاد هائی دسسرسی مزارع سمنورستان در قفول

كد و عنوان طرح: عملیات اجرایی احداث و برعمه جهاد هائی دسسرسی مزارع حومه شهرستان در قفول

شماره	وزنی %	جمع برآوردی	ستاره دار	فهرست بها	عنوان فصل	فصل	ردیف	فهرست بها
۱	۱۱۱	۸۳۸۶۶۱۸	۰	۸۳۸۶۶۱۸	عملیات خاکی باغچهسین	۳	۱	زاد و بانک
۲	۴۵۳۳	۳۲۱۰۷۱۷۴۵۴	۰	۳۲۱۰۷۱۷۴۵۴	عملیات خاکی باغچهسین	۱۴	۲	زاد و بانک
۳	۵۳.۵۷	۲۰۳۹۰۳۹۸۳	۰	۴۰۳۹۰۳۹۸۳	حمل و نقل	۲۰	۳	زاد و بانک
۵	۱۰۰۰۰	۷۵۴۰۰۷۰۵۵	۰	۷۵۴۰۰۷۰۵۵	جمع			



«برگه مالی»

کد پروژ:

فهرست بها زاد، زاد آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱

کد مدرک:

وضعیت: برگه مالی

نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان


برورد: جاده های دسترسی مزارع شهرستان دزفول
کد و عنوان طرح: عملیات اجرایی احداث و برنمه جاده های

تاریخ: ۱۴۰۱ / ۱

نام مهندس مشاور: مهندسین مشاور آب خاک انرژی جنوب

دستورسی مزارع حومه شهرستان دزفول

ردیف	کد فهرست	شرح کامل	شماره کار	رنال واحد	مقدار برآوردی	مبلغ برآوردی	ملاحظات
۱	۱۴۰۱۰۱	شماره رهن فر پو۵ رهن شهرسنگی با وسعت ۵۰۰ مترمربعی، به مساحت ۱۵۰ مترمربع	متر مربع	۲۶۸۰	۳۰۱۳۹۳۳۵	۸۳۸۶۳۱۸	
۲	۱۴۰۱۰۱	تیمه مصالح ریزه آسفالت، بارگیری و حمل و نقل یک کورمتری بتن و یک کورمتری بتن سبک و یک کورمتری بتن سبک که داده شده است. (۱۰۰ مترمربع)	مترمربع	۴۵۸۰۰۰	۴۴۴۳۶۶	۲۰۳۵۱۹۳۸	
۳	۱۴۰۱۰۱	پیمان: آبشویی، بتنریزی و گودش همزاد آسفالت به مساحت ۱۵۰ مترمربع	مترمربع	۱۵۵۵۰۰	۸۸۸۷۳۳	۱۳۸۰۹۷۸۲۶	
۴	۱۴۰۱۰۱	حمل آب برای آسفالت در مساحت یک کورمتری، ریزه آسفالت و بتن همزاد یک کورمتری	مترمربع	۱۷۷۰۰	۳۶۵۵۰۶۵	۶۰۹۱۳۴۵۳۰۱	
۵	۱۴۰۱۰۱	حمل آسفالت و بتن همزاد یک کورمتری	مترمربع	۱۳۶۰۰	۲۱۰۷۷۲۹۳۴	۳۰۲۶۵۷۶۸۳	



Handwritten signature in blue ink.

(هـ)

مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ،
خصوصی)، دستور العملها و استانداردهای فنی و
تعهدات



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the stamp.

مشخصات فنی عمومی

مشخصات فنی عمومی نشریه شماره ۱۰۸ شبکه‌های آبیاری و زهکشی مورد استناد است.



مشخصات فنی خصوصی

مشخصات فنی خصوصی عملیات اجرای احداث و ترمیم جاده های دسترسی مزارع حومه

شهرستان دزفول

در صورتی که مشخصات فنی خصوصی منضم به این پیمان در مواردی مسکوت باشد، در درجه اول دستورالعمل ها و مشخصات فنی و استانداردهای مصوب معمول در کشور (نشریه شماره ۱۰۸ سازمان برنامه و بودجه) و در درجه بعد استانداردها و مشخصات فنی و آیین نامه های معتبر بین المللی به عنوان مشخصات عمومی استفاده خواهد شد. در صورت نیاز به استفاده از مشخصات فنی استانداردها و آیین نامه های بین المللی، پیمانکار در هر مورد باید مشخصات آیین نامه ها یا استاندارد مورد نظر را پیشنهاد و پس از تأیید مشاور و تصویب کارفرما ملاک عمل قرار دهد.

ماده ۱- تشریح کلی پروژه:

موقعیت عمومی منطقه طرح: منطقه طرح در استان خوزستان و شهرستان دزفول قرار گرفته است.

ماده ۲- موضوع عملیات پیمان:

الف: کلیات موضوع عملیات این پیمان شامل:

عملیات اجرای احداث و ترمیم جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان دزفول.

بوته کنی، شخم زدن، بستر کوبی و خاکریزی و شن ریزی رویه جهت احداث جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان دزفول طبق نقشه و مشخصات و دستورکار دستگاه نظارت براساس فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱ به طول ۸۰۰ متر.

ب: اجرای عملیات خاکریزی جاده ها:

برای احداث جاده ها ابتدا اقدام به کوبیدن بستر خاکریز با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد می گردد. خاک این جاده ها از خاک اراضی غیر قابل آبیاری و یا خاک حاصل از زهکشها و کانالها و یا سایر تامین می گردد. به عملیات خاکریزی با تراکم ۹۰ درصد در یک لایه به ضخامت ۱۵ سانتیمتر صورت می پذیرد.

مصالح قشر فوق بایستی دارای دانه بندی پیوست باشد و پس از اختلاط و آبیاشی و کوبیدن بستری پایدار و محکم را تشکیل دهد. این مصالح باید عاری از مواد آلی و مضر باشد. مصالح مورد نیاز باید از بستر رودخانه و یا معادن شن و ماسه تامین شود.

در محل تلاقی زهکش های روباز اراضی کشاورزی با انهار آبیاری و جاده سرویس زهکشها و مزارع



۱- آب:

آب مورد نیاز جهت اجرای پروژه به فاصله ۵ کیلومتری محل اجرای پروژه تأمین خواهد شد.

۲- کیفیت و نحوه کاربرد مصالح:

کلیه مصالح و کاربرد آنها باید از نوع درجه یک و مطابق با مشخصات تعیین شده برای آنها باشد، مشخصات مصالح با آخرین مشخصات ASTM مطابقت داشته و قبل از استفاده از آنها باید به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.

۳- منابع قرضه:

استفاده از خاک‌های منطقه به طور مستقیم و عمده دارای محدودیت‌هایی می‌باشد و لیکن خاک مورد نیاز عملیات طرح را می‌توان از زمین‌های منطقه طرح، با نظر و تشخیص دستگاه نظارت از فاصله حمل ۱۰ کیلومتری محل طرح تأمین کرد.

مصالح سنگی مورد نیاز (تونان) با نظر و تشخیص دستگاه نظارت و تأیید کارفرما از مصالح منطقه و با فاصله حمل ۵۰ کیلومتری از سبز آب اندیمشک تا محل طرح تأمین می‌گردد.

ماده ۳- مشخصات عملیات پیمان:

۳-۱- کلیات:


پیمانکار موظف است با بررسی محل‌های اجرای عملیات و منطقه، راه‌های دسترسی و ارتباطی با در نظر گرفتن کلیه شرایط نسبت به پیش بینی منابع تهیه به موقع مصالح اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تجهیز کارگاه و تأمین ماشین آلات مورد نیاز نسبت به اتخاذ تدابیر ایمنی برای انجام کار اقدام نماید. ترتیب انجام عملیات پیمان در برنامه زمانی منضم به اسناد مناقصه (برنامه زمانی پیشنهادی مهندس مشاور) ارایه گردیده است. معهداً ترتیب اجرای کار ارایه شده هیچگونه تعهدی را جهت کارفرما و یا دستگاه نظارت ایجاد نخواهد کرد و پیمانکار خود مسئول نحوه اجرای عملیات مطابق مشخصات و در قالب مدت پیمان و هماهنگ با برنامه تفصیلی پیشنهادی با رعایت ماده ۱۸-ب شرایط خصوصی می‌باشد.

۳-۲- تذکرات مهم:

پیمانکار قبل از شروع هر یک از فعالیت‌های اصلی در تمام مسیر پروژه باید به طور کتبی مشخصات فعالیت و روش اجرای خود را به دستگاه نظارت اعلام نماید و پس از اخذ تاییدیه از دفتر نظارت مجاز به شروع آن فعالیت خواهد بود.

تمام عملیات اجرایی توسط آزمایشگاه مقیم نمونه گیری شده و اجازه ادامه فعالیت اجرایی منوط به جواب آزمایشگاه در خصوص تراکم لایه ها و کیفیت مصالح استفاده شده توسط پیمانکار می باشد.

طول جاده‌های اجرایی پیمان با توجه به وضعیت موجود آن و نوع فعالیت مورد نیاز (احداثی کامل یا ترمیمی) نسبت به طول احاطه شده در موافقتنامه (۸۰۰ کیلومتر) افزایش خواهد یافت. بدیهی است مقادیر پیمان بر این اساس بوده و منبای پرداخت به پیمانکار مقادیر و احجام کار انجام شده واقعی



می باشد و پیمانکار حق اعتراضی در خصوص افزایش طول جاده های اجرا شده نسبت به طول مندرج در پیمان ندارد.

۳-۳- درخت بری و علف کنی :

درخت بری، ریشه کنی و درآوردن درختان بایستی به صورت کامل و در تمامی عرض مورد نیاز پروژه صورت گیرد. لیکن تخریب و آسیب رسانی به درختانی که در خارج از محدوده عملیات خاکبرداری و خاکریزی قرار می گیرند در هیچ شرایطی مجاز نمی باشد مگر بر حسب ضرورت و به تشخیص دستگاه نظارت پروژه.

علف کنی و بوته کنی و ریشه کنی بوته ها در آن بخش از اراضی که در مسیر جاده سرویس، قرار می گیرد، ضرورت خواهد داشت.

۳-۶- تهیه پلان، پروفیل و مشخصات UTM مسیر جاده به صورت برداشت مشترک با دستگاه نظارت بوده و به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۴- تابلوهای ایمنی و علائم راهنمایی راه:

الف- تهیه و نصب علائم و تابلوهای ایمنی هشدار دهنده در مسیر عملیات پروژه و جاده های منتهی به این مسیر به عهده پیمانکار است.

ب- تهیه و نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی مشخص کننده فواصل و حریم راه با مشخصاتی که از طرف اداره ترافیک وزارت راه داده خواهد شد، در صورت ضرورت، به عهده پیمانکار است.

ج- تهیه و نصب تابلو مشخصات طرح به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۵- جرایم:

چنانچه کیفیت کار اجرا شده توسط پیمانکار به نحوی باشد که به تشخیص دستگاه نظارت تخریب و دوباره سازی آن الزامی باشد، مراتب توسط مهندس مقیم به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار موظف به انجام آن خواهد بود، بدون آنکه حق مطالبه هزینه ای جهت تخریب و دوباره سازی مناسب کار را طبق مشخصات فنی داشته باشد.

در صورتی که کیفیت کار اجرا شده خارج از مشخصات ولی در حد قابل قبولی باشد که بتوان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح کارفرما از تخریب آن جلوگیری نمود، در این حالت عملیات اجرا شده به تشخیص دستگاه نظارت مشمول جرایم متعلقه خواهد شد.

نحوه محاسبه ی جرایم خاکریزی به خاطر ازدیاد ضخامت

رواداری مجاز در ضخامت قشرهای خاکریز نسبت به مشخصات خواسته شده ۲+ سانتی متر می باشد و بهای عملیات خاکریزی متناسب با ضخامت لایه های خاکریز طبق نقشه ها و مشخصات فنی و دستورات کتبی دستگاه نظارت و براساس محاسبه و در صورت وضعیتها پرداخت خواهد گردید. در سایر موارد چنانچه ضخامت لایه های خاکریز در هر مورد بیشتر از ضخامت خواسته شده باشد در صورت موافقت دستگاه نظارت بابت هر سانتی متر افزایش ضخامت، کسریهایی معادل ۴ درصد قیمت ردیف



های مربوطه با ضخامت ۱۵ سانتی متر محاسبه و تحت عنوان جرائم از صورتوضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.

تعیین احجامی که نمونه های آزمایش شده معرف ضخامت آن قسمت می باشد با تشخیص دستگاه نظارت میزان تراکم لایه های زیرین مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

نحوه محاسبه جرائم خاکریز به خاطر نقصان کوبیدگی:

چنانچه درصد کوبیدگی خاک کمتر از درصد کوبیدگی ابلاغی باشد طبق صلاح دید دستگاه نظارت به شرح زیر عمل خواهد شد:

چنانچه نقصان کوبیدگی خاک نسبت به مشخصات ابلاغی کمتر از ۵ درصد باشد، پیمانکار مطابق دستور دستگاه نظارت موظف به کوبیدن مجدد خاکریز خواهد بود. این موارد با علامت RC در برگ نتایج آزمایش مشخص خواهند گردید.

چنانچه نقصان درجه کوبیدگی بیش از ۵ درصد باشد، پیمانکار طبق دستور دستگاه نظارت موظف به شخم زدم و عمل آوری مجدد خاک بوده و نسبت به کوبیدن آن اقدام خواهد کرد. این موارد با علامت RT در برگ نتایج آزمایش مشخص خواهند گردید و لازم است مجددا مورد آزمایش تعیین درصد کوبیدگی قرار بگیرند. بدیهی است هیچگونه پرداخت اضافه ای بابت انجام عملیات فوق صورت نخواهد گرفت. ضمناً در صورت مشاهده کوتاهی از طرف پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت در کلیه موارد فوق الذکر، جرائم زیر محاسبه و از صورت کارکردهای پیمانکار کسر خواهد گردید.

بابت ۱ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۱۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

بابت ۲ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۳۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

بابت ۳ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۶۵ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

بابت ۴ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۱۰۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

بابت ۵ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۲۰۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

بابت ۶ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۲۵۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

بابت ۷ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۳۰۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.



بابت ۸ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۳۵۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

بابت ۹ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۴۰۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

بابت ۱۰ درصد نقصان کوبیدگی نسبی معادل ۵۰۰ درصد قیمت کوبیدگی مترمکعب خاک برمیانی مشخصات.

تبصره: لازم به توضیح است جهت تسهیل در امر تفکیک کمیت کار و محاسبات مربوطه با توجه به اینکه تعداد آزمایشهای اجرائی آزمایشگاههای محلی نسبت به عملیات خاکی عموماً زیاد و قابل ملاحظه می باشد. (معمولاً برای معادل ۵۰۰ مترمربع سطح لایه خاکریزی با نظر دستگاه نظارت، یک آزمایش بعمل می آید) لذا به نسبت مربوطه هر واحد آزمایش انجام شده (قسمتهای اولیه و یا آزمایشهای مجدد که نتیجه نهایی آن بجای آزمایش اولیه بحساب می آید) نماینده حجم معینی از عملیات خاکی خواهد بود (مثلاً اگر ۵ درصد تعداد آزمایشها نقصان کوبیدگی داشت (اعم از RC و RT) ۵ درصد حجم عملیات خاکی مشمول جریمه ذیربط خواهد شد.

ماده ۶-حریم:

حریم کانال و ابنیه فنی مربوط طبق ضوابط کارفرما در شروع عملیات به پیمانکار ابلاغ خواهد شد و پیمانکار موظف است که راههای دسترسی، تاسیسات موقت و غیره را در محدوده حریم ایجاد نماید. در صورتی که پیمانکار به هر دلیل حتی به علت در اشغال بودن حریم توسط دیوی خاک و نظایر آن از اراضی خارج حریم استفاده نماید، خود موظف است که کلیه هزینه های لازم برای کسب مجوز یا حق عبور به مالکین مربوطه را رسماً پرداخت نماید.

ماده ۷-صورت وضعیتهای موقت عملیات:

ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تصریح می نماید که پیمانکار باید دلایل توجیهی در مورد مقادیر عملیات اجرایی که در صورت وضعیتهای موقت ماهانه نقل گردیده را ارائه دهد.

پیمانکار حداقل پنج نسخه از صورت وضعیت یاد شده توسط مهندس مشاور را با هزینه خود تکثیر و جهت ارسال به کارفرما در اختیار مشاور قرار خواهد داد. همچنین پیمانکار نرم افزارهای لازم جهت انجام عملیات و محاسبات متره و برآورد مقادیر کارهای انجام شده را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور مورد استفاده قرار خواهد داد و با هر صورت وضعیت لوح فشرده (CD) مربوطه را نیز در دو نسخه جهت مهندس مشاور و کارفرما ارائه خواهد کرد.

تایید صورت وضعیتهای موقت توسط دستگاه نظارت منوط به فراهم شدن قبلی دلایل توجیهی فوق می باشد.



بسمه تعالی



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۳	
موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژههای عمرانی	

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت/۸۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های:

- شماره ۲۳۲۹-۷۳۸/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴
- شماره ۸۱۴۵-۲۵۸۷/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱
- شماره ۷۱۴۰-۷۴۵۸/۵۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳

این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:

- ۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نثریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نثریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها، محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نشریه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.
- ۲- همه ساله فهرست به روز شده نثریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.

معاونت رئیس سازمان
محمدرضا عارف



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴/۲۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۱ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	$\frac{۱۰۲-۱۰۸۸/۵۴-۸۴۲}{۱۳۷۸/۳/۳}$	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	$\frac{۱۰۵-۸۴۲/۵۴-۲۴۶۰}{۱۳۷۹/۴/۲۹}$	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	$\frac{۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳}{۱۳۷۹/۵/۲۴}$	
۴	—	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	$\frac{۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۰۱}{۱۳۸۰/۱/۲۸}$	
۵	—	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهرسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	$\frac{۱۰۲-۱۱۷۸/۵-۵۶-۳۸۹۷}{۱۳۷۳/۳/۲۸}$	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک	$\frac{۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱}{۱۳۷۱/۱۱/۱۲}$	
۱۵	۸۳	نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان	$\frac{۱-۲۵۳۹/۵۶-۳۳۳}{۱۳۷۰/۳/۲۷}$	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	$\frac{۱-۲۴۵۰/۵۶-۳۸۰}{۱۳۶۳/۴/۱۱}$	



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳-۵۲/۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱-۱۳۸۵۰/۵۶-۱۳۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۵۹۸/۵۶-۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تا دهانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴-۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۲۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۵۴۹/۵۶-۲۰۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدیدنظر اول)	۱۰۵-۶۴۳۷/۵۴-۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمان های گوسفندداری	۱-۷۴۲۲/۵۶-۷۸۶ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱-۱۹۶۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مخازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۳۳۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۳/۵۲-۹۶۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشگاه های کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۵۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها (تجدیدنظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۵۴-۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳ ۰۵/۴۶۱۷ ۱۰۵/ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۳ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۳۵	۱۴۰	نقشه‌های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	—	
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	—	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۱۰۲-۶۳۲۴/۵۶-۱۳۳۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	
۳۸	۱۴۳	برنامه ریزی و طراحی هتل	—	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده روی (سه جلد)	—	
۴۰	۱۴۵	تقاطع‌های همسطح شهری (سه جلد)	۱۰۲-۱۴۱۰/۵۴-۸۹۵ ۱۳۷۶/۳/۱۹	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۱۰۲-۲۰۴۲/۵۶-۵۶۰ ۱۳۷۵/۴/۲۰	
۴۲	۱۵۱	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	—	
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	—	
۴۴	۱۶۱	آیین نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۲۴۲/۵۶-۱۵۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۹	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۲۲۰۶/۵۴-۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۵/۴	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه‌های مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۴۳۱۱ ۱۳۷۸/۸/۱۰	
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	
۵۱	۱۹۶	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲-۶۵۱/۵۴-۵۲۵۵ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴-۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه

ردیف	شماره تشریحی	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی و مرحله زمینی فرودگاهها	۱۰۲ ۶۵۰۹/۵۲ ۵۲۵۲ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی و ازمای بندهای انحراف	۱۰۲ ۸۲۰۳/۵۲ ۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵ ۷۳۶/۵۴-۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از مولوسپونهای قیری در راه سازی	—	
۵۶	۲۱۴	راه های طراحی، ساخت و نگهداری کوره ها	۱۰۵ ۸۰۵۳/۵۲-۵۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زباله شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه های محاسبات محاری آب و یرز مینی بتنی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل اوزان و سیستم محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل اساسی، توجیه و تفصیلی)	۱۰۵/۴۴۱۶-۵۴/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۲/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان ویجار متنازها	۱۰۲ ۲۱۲۲/۵ ۵۴ ۲۰۵۸۱ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ تکمیلی

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضا
۶۲	-	بهره گیری از مصالح استاندارد	$\frac{۴۰۰/۴۲۰/۲۷۱۰۳}{۸۸/۶/۱۴}$	*
۶۳	-	بکار گیری نیروهای مورد نیاز پروژه از بین کارگران بومی محل	$\frac{۴۴/۱/۲۰۸۷}{۸۷/۱/۲۸}$	*
۶۴	-	آیین نامه اخذ پوشش بیمه ای لازم	$\frac{۱۰۵۶۰۰}{۹۰/۴/۲۴}$	*
۶۵	۳۴۶-۲	مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی جلد دوم: آبیاری و تسطیح اراضی	$\frac{۱۰۰/۷۴۸۰۷}{۸۵/۰۵/۰۴}$	*
۶۶				





دستور العمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران صفحه ۹ از ۹

پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰ مورخ: ۷۷/۱۲/۳

فرم شماره (۲) مشخصات پیمان

مشخصات طرح
 عنوان طرح: احداث و ترمیم جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان های استان خوزستان شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱
 عنوان پروژه: عملیات اجرای احداث و ترمیم جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان دزفول شماره پروژه: ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱
 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:
 محل تأمین اعتبار، درآمدهای عمومی (اعتبار عمرانی) در آمد اختصاصی سایر منابع

مشخصات پیمانکار
 نام پیمانکار: شرکت آوند آب جنوب رشته کاری مورد نظر: آب رتبه: ۵
 شماره تشخیص صلاحیت: ۵۰۰۵۷۱ آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ محل اخذ صلاحیت: خوزستان

مشخصات اصلی پیمان
 موضوع پیمان: عملیات اجرای احداث و ترمیم جاده های دسترسی مزارع حومه شهرستان دزفول
 محل اجرا: اراضی حومه شهرستان دزفول
 مبلغ پیمان: ۱.۴۷۵.۸۱۵.۳۶۲ ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۱.۴۰۵۵ مدت پیمان: ۱ ماه

فهرستهای منظم پیمان

فهرست رشته	تاریخ انتشار	ضریب منطقه ای	نوع فهرست		
			پایه	غیر پایه	سایر
رشته راه، راه آهن و باند	۱۴۰۱	۱.۰۳	*		

تعدیل آحاد بها
 مشمول تعدیل آحاد بها: آری خیر
 تاریخ برگزاری مناقصه:
 تاریخ تسلیم پیشنهاد، سه ماهه سال ۱۳، ترک مناقصه: تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی:


اكثرها
 در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است، مجوز لازم در موعد مقرر، از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری خیر ، نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره تاریخ
 در مورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری خیر نامه ابلاغ مجوز به شماره تاریخ

ضوابط و معیارها

ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث، به شماره (های):

۱۰۸	۳۴۶	۱۰۱	۱۲۰	۱۱۰	۱۲۸-۱۵ ۱۲۸-۴	۵۵	۲۶۱
-----	-----	-----	-----	-----	--------------	----	-----

فرم شماره (۲) مشخصات پیمان




(و)

نقشه ها



0,15

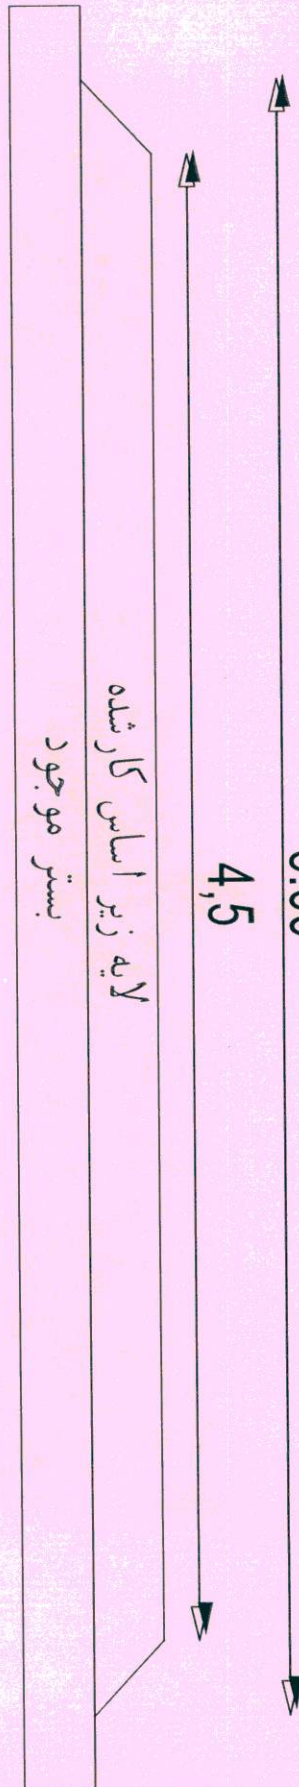

طول مسیر ۸۰۰ متر

5.00

4,5

لایه زیر اساس کار شده

بستر موجود



(ز)
برنامه زمانبندی

